

# 四日市港海岸 工事便り【令和7年12月】

～四日市の未来を支える災害に強い護岸へ～

Vol.1



国土交通省 中部地方整備局  
四日市港湾事務所 海岸課  
TEL:059-359-0163

沿岸地域の皆様へ 四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の工事状況をお知らせします。



## 四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要

### 事業目的

四日市港海岸において、海岸保全施設の耐震改良と嵩上げを実施することで、発生確率の高い津波(L1津波)や高潮(伊勢湾台風クラス)から地域住民の生命・財産を防護するとともに、企業活動を維持します。

### 事業内容

【整備施設】護岸(改良)3,862m、胸壁(改良)884m  
樋門(改良)5基、陸閘(改良)11基  
【総事業費】250億円  
【事業期間】令和6年度～令和17年度

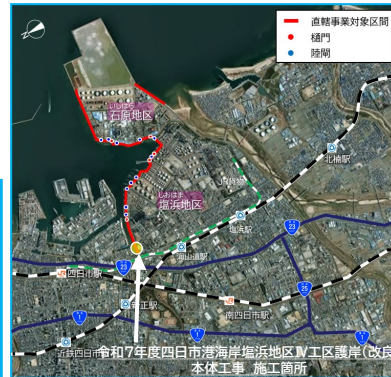

## 【工事進捗状況】



既設護岸状況(工着手前)



防塵・防音シート設置



舗装版撤去後



油圧ブレーカーによる舗装版撤去


## 【令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事 工程表】

年 月 日	令和7年								令和8年			
	9月		10月		11月		12月		1月		2月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
工 種												
準備工												
仮設工												
構造物撤去工												
土工												
本体工(鋼管矢板工場製作)												
本体工(鋼管矢板打設)												
片付工												

## 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事の概要

塩浜地区IV工区護岸において、仮設工(仮護岸整備)、構造物撤去工、土工(掘削)、本体工(鋼管矢板打設)を実施します。【工期：令和7年9月4日～令和8年3月27日】

### 施工イメージ

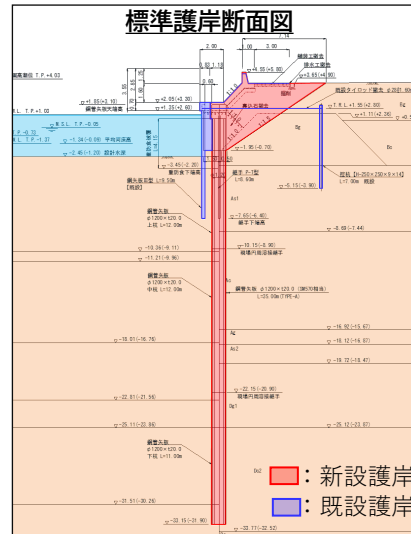

### 現場担当者より

平素は四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業に対して、ご理解・ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和6年度に事業採択されました本事業は、石原・塩浜地区の海岸保全施設の耐震化及び嵩上げを実施するもので、現在、塩浜街道に架かる大井の川橋右岸側(塩浜IV-1工区)から護岸の改良工事に着手しています。

本年度は、護岸本体となる鋼管矢板78本のうち21本を打設する工事で、10月から作業ヤードの整備や防護柵の設置などに着手し、11月末までに舗装版や一部護岸の撤去を行いました。12月から既設護岸上部工の撤去に先立ち、陸側に鋼矢板による仮設の防護ラインを整備します。

今後も安全第一で整備してまいりますので、引き続き皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。
